ATKINS
Member of the SNC-Lavalin Group
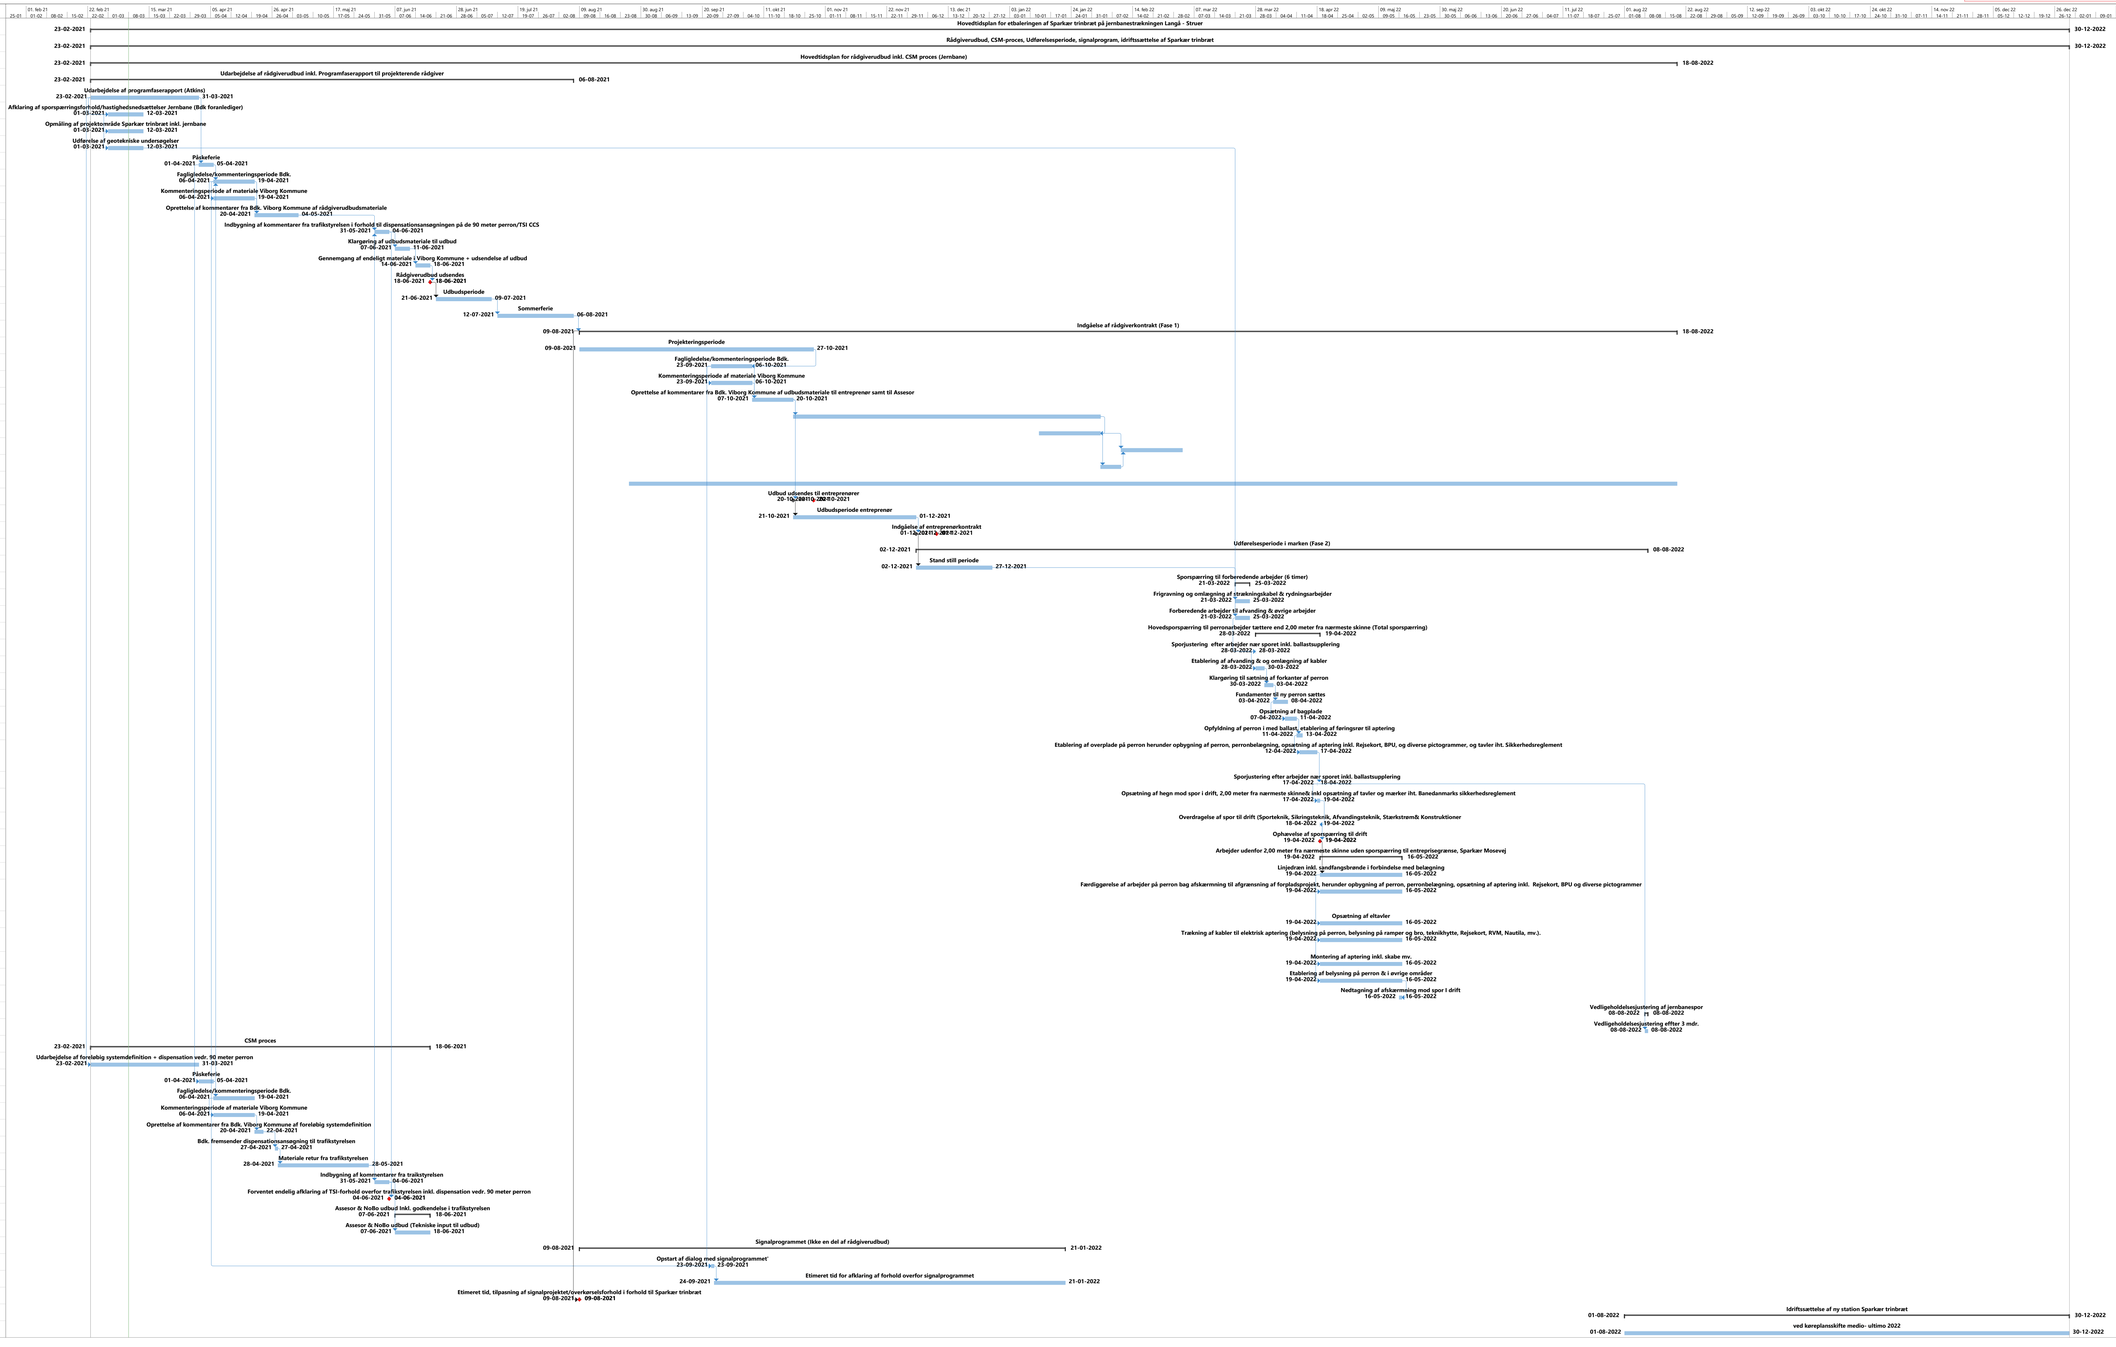
Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Hovedtidsplan for etbaleringen af Sparkær trinbrænt på jernbanestrækningen Langå - Struer**	**481 dage**	**23-02-21 08:00**	**30-12-22 17:00**
2	**Rådgiverudbud, CSM-proces, Udførelsesperiode, signalprogram, idriftsættelse af Sparkær trinbræt**	**481 dage**	**23-02-21 08:00**	**30-12-22 17:00**
3	**Hovedtidsplan for rådgiverudbud inkl. CSM proces (Jernbane)**	**385 dage**	**23-02-21 08:00**	**18-08-22 17:00**
4	**Udarbejdelse af rådgiverudbud inkl. Programfaserapport til projekterende rådgiver**	**116 dage**	**23-02-21 08:00**	**06-08-21 17:00**
5	Udarbejdelse af programfaserapport (Atkins)	27 dage	23-02-21 08:00	31-03-21 17:00
6	Afklaring af sporsparringsforhold/hastighedsnedsættelser Jernbane (Bdk foranlediger)	10 dage	01-03-21 08:00	12-03-21 17:00
7	Opmåling af projektområde Sparkær trinbræt inkl. jernbane	10 dage	01-03-21 08:00	12-03-21 17:00
8	Udførelse af geotekniske undersøgelser	10 dage	01-03-21 08:00	12-03-21 17:00
9	Påskeferie	3 dage	01-04-21 08:00	05-04-21 17:00
10	Fagligdelse/kommenteringsperiode Bdk.	10 dage	06-04-21 08:00	19-04-21 17:00
11	Kommenteringsperiode af materiale Viborg Kommune	10 dage	06-04-21 08:00	19-04-21 17:00
12	Oprettelse af kommentarer fra Bdk. Viborg Kommune af rådgiverudbudsmateriale	10 dage	20-04-21 08:00	04-05-21 17:00
13	Indbygning af kommentarer fra trafikstyrelsen i forhold til dispensationsansøgningen på de 90 meter perron/TSI CCS	5 dage	31-05-21 08:00	04-06-21 17:00
14	Klargøring af udbudsmateriale til udbud	5 dage	07-06-21 08:00	11-06-21 17:00
15	Gennemgang af endeligt materiale i Viborg Kommune + udsendelse af udbud	5 dage	14-06-21 08:00	18-06-21 17:00
16	Rådgiverudbud udsendes	0 dage	18-06-21 17:00	18-06-21 17:00
17	Udbudsperiode	15 dage	21-06-21 08:00	09-07-21 17:00
18	Sommerferie	20 dage	12-07-21 08:00	06-08-21 17:00
19	**Indgåelse af rådgiverkontrakt (Fase 1)**	**269 dage**	**09-08-21 08:00**	**18-08-22 17:00**
20	Projekteringsperiode	58 dage	09-08-21 08:00	27-10-21 17:00
21	Fagligdelse/kommenteringsperiode Bdk.	10 dage	23-09-21 08:00	06-10-21 17:00
22	Kommenteringsperiode af materiale Viborg Kommune	10 dage	23-09-21 08:00	06-10-21 17:00
23	Oprettelse af kommentarer fra Bdk. Viborg Kommune af udbudsmateriale til entreprenør samt til Assesor	10 dage	07-10-21 08:00	20-10-21 17:00
24	Assering af systemdefinition, farelog, sikkerhedsplan & sikkerhedsdokumentation (3 iterationer) for SVR projektering	75 dage	21-10-21 08:00	02-02-22 17:00
25	NoBo, ISV projektering	15 dage	13-01-22 08:00	02-02-22 17:00
26	Behandling af SVR & ISV i trafikstyrelsen	15 dage	10-02-22 08:00	02-03-22 17:00
27	Ansøgning om gravetilladelse i Banedanmark inkl. godkendelse af denne	5 dage	03-02-22 08:00	09-02-22 17:00
28	Assesering/ Nobo godkendelse i marken i forbindelse med udførelsen af projektet	256 dage	26-08-21 08:00	18-08-22 17:00
29	Udbud udsendes til entreprenører	0 dage	20-10-21 17:00	20-10-21 17:00
30	Udbudsperiode entreprenør	30 dage	21-10-21 08:00	01-12-21 17:00
31	Indgåelse af entreprenørkontrakt	0 dage	01-12-21 17:00	01-12-21 17:00
32	**Udførelsesperiode i marken (Fase 2)**	**178 dage**	**02-12-21 08:00**	**08-08-22 17:00**
33	Stand still periode	18 dage	02-12-21 08:00	27-12-21 17:00
34	**Sporsparring til forberedende arbejder (6 timer)**	**5 dage**	**21-03-22 08:00**	**25-03-22 17:00**
35	Frigravning og omlægning af strækningskabel & rydningsarbejder	5 dage	21-03-22 08:00	25-03-22 17:00
36	Forberedende arbejder til afvanding & øvrige arbejder	5 dage	21-03-22 08:00	25-03-22 17:00
37	**Hovedsporsparring til perronarbejder tættere end 2,00 meter fra nærmeste skinne (Total sporsparring)**	**16 dage**	**28-03-22 00:00**	**19-04-22 04:00**
38	Sporjustering efter arbejder nær sporet inkl. ballastsupplering	1 dag	28-03-22 00:00	28-03-22 08:00
39	Etablering af afvanding & og omlægning af kabler	67 tim.	28-03-22 00:00	30-03-22 19:00
40	Klargøring til sætning af forkanter af perron	81 tim.	30-03-22 19:00	03-04-22 04:00
41	Fundamenter til ny perron sættes	124 tim.	03-04-22 04:00	08-04-22 08:00
42	Opsætning af bagplade	96 tim.	07-04-22 04:00	11-04-22 04:00
43	Opfyldning af perron i med ballast, etablering af føringsrør til aptering	48 tim.	11-04-22 04:00	13-04-22 04:00
44	Etablering af overplade på perron herunder opbygning af perron, perronbelægning, opsætning af aptering inkl. Rejsekort, BPU, og diverse pictogrammer, og tavler iht. Sikkerhedsreglement	138 tim.	12-04-22 04:00	17-04-22 22:00
45	Sporjustering efter arbejder nær sporet inkl. ballastsupplering	9 tim.	17-04-22 22:00	18-04-22 07:00
46	Opsætning af hegn mod spor i drift, 2,00 meter fra nærmeste skinne& inkl opsætning af tavler og mærker iht. Banedanmarks sikkerhedsreglement	30 tim.	17-04-22 22:00	19-04-22 04:00
47	Overdragelse af spor til drift (Sporteknik, Sikringsteknik, Afvandingsteknik, Stærkstrøm& Konstruktioner	9 tim.	18-04-22 19:00	19-04-22 04:00
48	Ophævelse af sporsparring til drift	0 tim.	19-04-22 04:00	19-04-22 04:00
49	**Arbejder udenfor 2,00 meter fra nærmeste skinne uden sporsparring til entreprisegrænse, Sparkær Mosevej**	**20 dage**	**19-04-22 08:00**	**16-05-22 17:00**
50	Linjedrøn inkl. sandfangsbrønde i forbindelse med belægning	20 dage	19-04-22 08:00	16-05-22 17:00
51	Færdiggørelse af arbejder på perron bag afskærmning til afgrænsning af forsladsprojekt, herunder opbygning af perron, perronbelægning, opsætning af aptering inkl. Rejsekort, BPU og diverse pictogrammer	20 dage	19-04-22 08:00	16-05-22 17:00
52	Opsætning af eltavler	20 dage	19-04-22 08:00	16-05-22 17:00
53	Trækning af kabler til elektrisk aptering (belysning på perron, belysning på ramper og bro, teknikhytte, Rejsekort, RVM, Nautila, mv.).	20 dage	19-04-22 08:00	16-05-22 17:00
54	Montering af aptering inkl. skabe mv.	20 dage	19-04-22 08:00	16-05-22 17:00
55	Etablering af belysning på perron & i øvrige områder	20 dage	19-04-22 08:00	16-05-22 17:00
56	Nedtagning af afskærmning mod spor I drift	1 dag	16-05-22 08:00	16-05-22 17:00
57	**Vedligeholdelsesjustering af jernbanespor**	**1 dag**	**08-08-22 08:00**	**08-08-22 17:00**
58	Vedligeholdelsesjustering effter 3 mdr.	1 dag	08-08-22 08:00	08-08-22 17:00
59	**CSM proces**	**81 dage**	**23-02-21 08:00**	**18-06-21 17:00**
60	Udarbejdelse af foreløbig systemdefinition + dispensation vedr. 90 meter perron	27 dage	23-02-21 08:00	31-03-21 17:00
61	Påskeferie	3 dage	01-04-21 08:00	05-04-21 17:00
62	Fagligdelse/kommenteringsperiode Bdk.	10 dage	06-04-21 08:00	19-04-21 17:00
63	Kommenteringsperiode af materiale Viborg Kommune	10 dage	06-04-21 08:00	19-04-21 17:00
64	Oprettelse af kommentarer fra Bdk. Viborg Kommune af foreløbig systemdefinition	3 dage	20-04-21 08:00	22-04-21 17:00
65	Bdk. fremsender dispensationsansøgning til trafikstyrelsen	1 dag	27-04-21 08:00	27-04-21 17:00
66	Materiale retur fra trafikstyrelsen	20 dage	28-04-21 08:00	28-05-21 17:00
67	Indbygning af kommentarer fra trakstyrelsen	5 dage	31-05-21 08:00	04-06-21 17:00
68	Forventet endelig afklaring af TSI-forhold overfor trafikstyrelsen inkl. dispensation vedr. 90 meter perron	0 tim.	04-06-21 17:00	04-06-21 17:00
69	**Assesor & NoBo udbud Inkl. godkendelse i trafikstyrelsen**	**10 dage**	**07-06-21 08:00**	**18-06-21 17:00**
70	Assesor & NoBo udbud (Tekniske input til udbud)	10 dage	07-06-21 08:00	18-06-21 17:00
71	**Signalprogrammet (Ikke en del af rådgiverudbud)**	**120 dage**	**09-08-21 08:00**	**21-01-22 17:00**
72	Opstart af dialog med signalprogrammet'	1 dag	23-09-21 08:00	23-09-21 17:00
73	Etimeret tid for afklaring af forhold overfor signalprogrammet	86 dage	24-09-21 08:00	21-01-22 17:00
74	Etimeret tid, tilpasning af signalprojektet/overkørselsforhold i forhold til Sparkær trinbrænt	0 dage	09-08-21 08:00	09-08-21 08:00
75	**Idriftsættelse af ny station Sparkær trinbrænt**	**110 dage**	**01-08-22 08:00**	**30-12-22 17:00**
76	ved køreplanskifte medio- ultimo 2022	110 dage	01-08-22 08:00	30-12-22 17:00
